

<div></div> <div></div>				Relatório nº	40
				Data do relatório	01/10/2024
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	51 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	38 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Atividades (2)	
CONCRETAGEM DAS CINTAS DA EDIFICAÇÃO	70% - Paralisada
SEM ATIVIDADES. AGUARDANDO O CONCRETO.	Paralisada

Comentários (1)
ANDERSON CURCZ 06/10/2024 00:13 CRONOGRAMA EM ATRASO - 15 DIAS




Aprovado 06/10/2024 00:13

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 10/10/2024 14:39

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 26/11/2024 12:40

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	41
				Data do relatório	02/10/2024
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	52 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	37 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Atividades (2)	
CONCRETAGEM DAS CINTAS DA EDIFICAÇÃO	70% - Paralisada
SEM ATIVIDADES. AGUARDANDO O CONCRETO.	Paralisada

Comentários (1)
ANDERSON CURCZ 06/10/2024 00:15 CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS




Aprovado 06/10/2024 00:16

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 10/10/2024 14:39

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 26/11/2024 12:40

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro



<div></div> <div></div>				Relatório nº	42
				Data do relatório	03/10/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	53 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	36 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (14)						
Engenheiro 2						Mão de Obra Indireta (2)
O3 empreendimentos 12						Terceiros (12)

Atividades (1)	
CONCRETAGEM DAS CINTAS DA EDIFICAÇÃO	100% - Concluída

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 06/10/2024 00:16 CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS	

Fotos (3)	
	




Aprovado 09/10/2024 15:34

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 10/10/2024 14:38

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 26/11/2024 12:40

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	43
				Data do relatório	04/10/2024
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	54 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	35 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (4)						
Serralheiro 3						Mão de Obra Direta (3)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Atividades (1)	
RECEBIMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA.	Em Andamento

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 06/10/2024 00:20 CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS	

Fotos (12)	
	
CINTA DA EDIFICAÇÃO CONCRETADA	CINTA DA EDIFICAÇÃO CONCRETADA
	
CINTA DA EDIFICAÇÃO CONCRETADA	CINTA DA EDIFICAÇÃO CONCRETADA



CINTA DA EDIFICAÇÃO CONCRETADA



CINTA DA EDIFICAÇÃO CONCRETADA



CINTA DA EDIFICAÇÃO CONCRETADA



CINTA DA EDIFICAÇÃO CONCRETADA



CINTA DA EDIFICAÇÃO CONCRETADA



CINTA DA EDIFICAÇÃO CONCRETADA



CINTA DA EDIFICAÇÃO CONCRETADA



CINTA DA EDIFICAÇÃO CONCRETADA

Aprovado 06/10/2024 00:22

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL

Aprovado 10/10/2024 14:38

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL

Aprovado 26/11/2024 12:40

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	44
				Data do relatório	05/10/2024
				Dia da semana	Sábado
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	55 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	34 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável


Mão de obra (6)						
Eletricista 1	Serralheiro 5					Mão de Obra Direta (6)

Atividades (1)	
MONTAGEM DA ESTRUTURA DA COBERTURA	10% - Em Andamento

Comentários (1)	
<p>ANDERSON CURCZ 06/10/2024 00:34</p> <p>O ENG. ELETRICISTA MARCOS, CONTRATADO DIRETAMENTE PELO IPC, ESTEVE NO LOCAL ORIENTANDO A EQUIPE DA ESTRUTURA METÁLICA.</p> <p>A ENERGIA FOI DESLIGADA PARA A MONTAGEM DA ESTRUTURA CENTRAL E RELIGADA. MARCOS REALIZOU TODOS OS TESTES.</p> <p>CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS</p>	

Fotos (1)	
	


Aprovado 06/10/2024 00:34
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 10/10/2024 14:38
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 26/11/2024 12:40
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	45
				Data do relatório	07/10/2024
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	57 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	32 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (7)						
Serralheiro 5						Mão de Obra Direta (5)
Arquiteta 1	Engenheiro 1					Mão de Obra Indireta (2)

Atividades (1)	
MONTAGEM DA ESTRUTURA DA COBERTURA	10% - Em Andamento

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 09/10/2024 15:25 CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS	

Fotos (4)






Aprovado 09/10/2024 15:32

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 10/10/2024 14:38

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 26/11/2024 12:40

Juliana da Silva Colloço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro


<div></div> <div></div>				Relatório nº	46
				Data do relatório	08/10/2024
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	58 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	31 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável


Mão de obra (5)						
Serralheiro						Mão de Obra Direta (5)
5						

Atividades (1)	
MONTAGEM DA ESTRUTURA DA COBERTURA	10% - Em Andamento

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 09/10/2024 15:25 CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS	

Fotos (1)	
	


Aprovado 28/11/2024 15:30
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/11/2024 17:39
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/11/2024 18:43
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	47
				Data do relatório	09/10/2024
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	59 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	30 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	Nublado	Praticável
Tarde	Chuvoso	Impraticável


Mão de obra (5)						
Serralheiro						Mão de Obra Direta (5)
5						

Atividades (1)	
MONTAGEM DA ESTRUTURA DA COBERTURA	10% - Em Andamento



Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 09/10/2024 15:25 CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS	

Fotos (3)	
	
	


Aprovado 09/10/2024 15:27
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 10/10/2024 14:38
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 26/11/2024 12:41
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro


				Relatório nº	48
				Data do relatório	10/10/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	60 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	29 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Chuvoso	Impraticável
Tarde	☁ Chuvoso	Impraticável



Atividades (1)	
MONTAGEM DA ESTRUTURA DA COBERTURA	15% - Paralisada

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 16/10/2024 15:10 CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS	


Aprovado 16/10/2024 15:10
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/11/2024 17:39
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/11/2024 18:44
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

				Relatório nº	49
				Data do relatório	11/10/2024
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	61 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	28 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Chuvoso	Impraticável
Tarde	☁ Chuvoso	Impraticável

Atividades (1)	
MONTAGEM DA ESTRUTURA DA COBERTURA	15% - Paralisada

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 16/10/2024 15:10 CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS	




Aprovado 16/10/2024 15:10

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL




Aprovado 28/11/2024 17:39

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/11/2024 18:44

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

				Relatório nº	50
				Data do relatório	14/10/2024
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	64 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	25 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável


Mão de obra (5)						
Serralheiro						Mão de Obra Direta (5)
5						

Atividades (1)	
MONTAGEM DA ESTRUTURA DA COBERTURA	25% - Em Andamento

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 16/10/2024 15:10 CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS	


Aprovado 28/11/2024 15:33
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/11/2024 17:39
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/11/2024 18:44
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	51
				Data do relatório	15/10/2024
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	65 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	24 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (7)						
Serralheiro 5						Mão de Obra Direta (5)
Engenheiro 2						Mão de Obra Indireta (2)

Atividades (1)	
MONTAGEM DA ESTRUTURA DA COBERTURA	35% - Em Andamento

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 16/10/2024 15:10 CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS	

Fotos (3)	
	
	




Aprovado 16/10/2024 16:08

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/11/2024 17:39

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/11/2024 18:44

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	52
				Data do relatório	16/10/2024
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	66 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	23 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (7)						
Serralheiro 5						Mão de Obra Direta (5)
Engenheiro 2						Mão de Obra Indireta (2)

Atividades (1)	
MONTAGEM DA ESTRUTURA DA COBERTURA	55% - Em Andamento

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 16/10/2024 15:10 CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS	

Fotos (5)	
 <p>16 Oct 2024 at 10:00:46 Rua Coronel Dulcídio, 921 Batel Curitiba PR 30420-170</p>	 <p>16 Oct 2024 at 10:07:18 Rua Coronel Dulcídio, 921 Batel Curitiba PR 30420-170</p>
 <p>16 Oct 2024 at 10:07:12 Rua Coronel Dulcídio, 921 Batel Curitiba PR 30420-170</p>	



Aprovado 28/11/2024 15:41

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL

Aprovado 28/11/2024 17:39

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL

Aprovado 28/11/2024 18:44

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro





<div></div> <div></div>				Relatório nº	53
				Data do relatório	17/10/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	67 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	22 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Serralheiro 5						Mão de Obra Direta (5)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)
Solar Company Elétrica 3						Terceiros (3)

Atividades (2)	
MONTAGEM DA ESTRUTURA DA COBERTURA	60% - Em Andamento
INÍCIO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE ELÉTRICA CONTRATADA PELO IPC	Em Andamento

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 16/10/2024 15:10 CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS	

Fotos (8)	
	
	



Aprovado 28/11/2024 15:46

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL

Aprovado 28/11/2024 17:40

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL

Aprovado 28/11/2024 18:45

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	54
				Data do relatório	18/10/2024
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	68 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	21 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Serralheiro 5						Mão de Obra Direta (5)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)
Solar Company Elétrica 3						Terceiros (3)

Atividades (2)	
MONTAGEM DA ESTRUTURA DA COBERTURA	70% - Em Andamento
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE ELÉTRICA CONTRATADA PELO IPC	Em Andamento

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 16/10/2024 15:10 CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS	

Fotos (4)	
	



Aprovado 28/11/2024 15:47

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL

Aprovado 28/11/2024 17:40

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL

Aprovado 28/11/2024 18:45

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório n°	55
				Data do relatório	21/10/2024
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	71 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	18 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de obra (11)						
Calheiro 2	Serralheiro 5					Mão de Obra Direta (7)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)
Solar Company Elétrica 3						Terceiros (3)

Atividades (3)	
MONTAGEM DA ESTRUTURA DA COBERTURA	75% - Em Andamento
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE ELÉTRICA CONTRATADA PELO IPC	Em Andamento
SERVIÇO DE CALHA E RUFO INICIADO	Em Andamento

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 16/10/2024 15:10 CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS	


Aprovado 28/11/2024 15:49
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/11/2024 17:40
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/11/2024 18:45
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

				Relatório nº	56
				Data do relatório	22/10/2024
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	72 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	17 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☁️ Nublado	Praticável

Mão de obra (9)						
Calheiro 2	Serralheiro 4					Mão de Obra Direta (6)
Solar Company Elétrica 3						Terceiros (3)

Atividades (3)	
MONTAGEM DA ESTRUTURA DA COBERTURA	80% - Em Andamento
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE ELÉTRICA CONTRATADA PELO IPC	Em Andamento
SERVIÇO DE CALHA E RUFO EM ANDAMENTO	Em Andamento

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 16/10/2024 15:10 CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS	


Aprovado 28/11/2024 15:50
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/11/2024 17:40
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/11/2024 18:46
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

				Relatório nº	57
				Data do relatório	23/10/2024
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	73 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	16 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Chuvoso	Praticável
Tarde	☁ Chuvoso	Impraticável

Mão de obra (10)						
Calheiro 2	Serralheiro 5					Mão de Obra Direta (7)
Solar Company Elétrica 3						Terceiros (3)

Atividades (3)	
MONTAGEM DA ESTRUTURA DA COBERTURA	85% - Em Andamento
FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE ELÉTRICA CONTRATADA PELO IPC	Concluída
SERVIÇO DE CALHA E RUFO FINALIZADO	Concluída

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 16/10/2024 15:10 CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS	


Aprovado 28/11/2024 15:50
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/11/2024 17:37
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL




Aprovado 28/11/2024 18:46
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	58
				Data do relatório	24/10/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	74 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	15 dias




Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Atividades (1)	
MONTAGEM DA ESTRUTURA DA COBERTURA	95% - Em Andamento

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 16/10/2024 15:10 CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS	

Fotos (9)	
 <p>Rua Coronel Dulcidio, 921 Batel Curitiba PR 80420-170 S 25° 26' 29", W 49° 16' 53" 24/10/2024, 11:03</p>	 <p>Avenida Visconde de Guarapuava, 4186 Batel Curitiba PR 80250-220 S 25° 26' 30", W 49° 16' 52" 24/10/2024, 10:51</p>

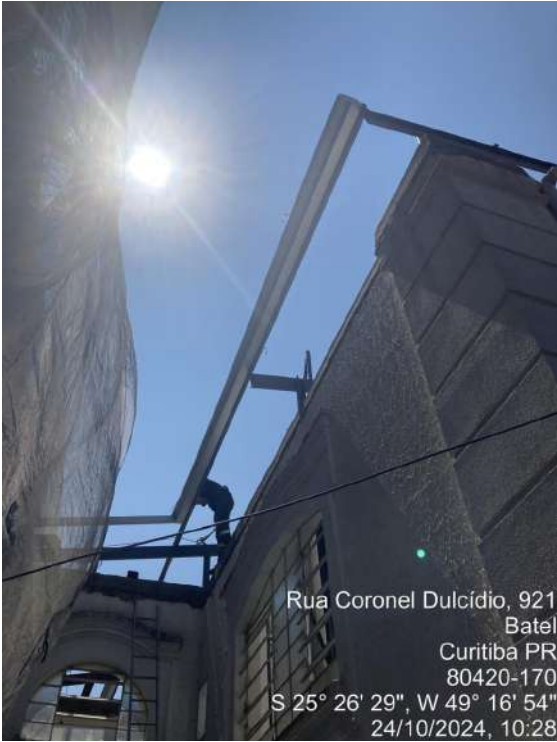

 <p>Rua Coronel Dulcídio, 921 Batel Curitiba PR 80420-170 S 25° 26' 29", W 49° 16' 54" 24/10/2024, 10:28</p>	 <p>Avenida Visconde de Guarapuava, 4186 Batel Curitiba PR 80250-220 S 25° 26' 29", W 49° 16' 54" 24/10/2024, 10:03</p>
 <p>Avenida Visconde de Guarapuava, 4186 Batel Curitiba PR 80250-220 S 25° 26' 30", W 49° 16' 52" 24/10/2024, 10:52</p>	




Aprovado 28/11/2024 15:51

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL





Aprovado 28/11/2024 17:41

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/11/2024 18:46

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

				Relatório nº	59
				Data do relatório	25/10/2024
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	75 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	14 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de obra (5)						
Serralheiro 5						Mão de Obra Direta (5)

Atividades (2)	
MONTAGEM DA ESTRUTURA DA COBERTURA	100% - Concluída
IÇAMENTO DAS TELHAS TERMOACÚSTICAS	Iniciada

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 16/10/2024 15:10 CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS	


Aprovado 28/11/2024 15:52
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/11/2024 17:41
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/11/2024 18:46
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro



<div></div> <div></div>				Relatório nº	60
				Data do relatório	28/10/2024
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	78 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	11 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (5)					
Serralheiro					Mão de Obra Direta (5)
5					

Atividades (1)	
MONTAGEM DAS TELHAS TERMOACÚSTICAS	20% - Em Andamento

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 16/10/2024 15:10 CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS	

Fotos (7)	
 <p>Avenida Visconde de Guarapuava, 4186 Batel Curitiba PR 80250-220 S 25° 26' 29", W 49° 16' 53" 28/10/2024, 14:07</p>	 <p>Avenida Visconde de Guarapuava, 4186 Batel Curitiba PR 80250-220 S 25° 26' 29", W 49° 16' 53" 28/10/2024, 14:07</p>



Aprovado 28/11/2024 15:52


ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL

Aprovado 28/11/2024 17:38

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL

Aprovado 28/11/2024 18:46

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

				Relatório nº	61
				Data do relatório	29/10/2024
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	79 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	10 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Atividades (1)	
MONTAGEM DAS TELHAS TERMOACÚSTICAS	20% - Paralisada

Ocorrências (1)	
TELHAS TERMOACÚSTICAS EM ATRASO	
Falta de material	

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 16/10/2024 15:10	
CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS	


Aprovado 28/11/2024 15:53
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/11/2024 17:38
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/11/2024 18:50
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	62
				Data do relatório	30/10/2024
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	80 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	9 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável


Mão de obra (5)						
Serralheiro						Mão de Obra Direta (5)
5						

Atividades (1)	
MONTAGEM DAS TELHAS TERMOACÚSTICAS	80% - Em Andamento



Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 16/10/2024 15:10 CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS	

Fotos (2)	
	


Aprovado 28/11/2024 15:58
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/11/2024 17:38
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/11/2024 18:55
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

				Relatório nº	63
				Data do relatório	31/10/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	81 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	8 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável


Mão de obra (5)						
Serralheiro						Mão de Obra Direta (5)
5						

Atividades (1)	
MONTAGEM DAS TELHAS TERMOACÚSTICAS	100% - Concluída

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 28/11/2024 17:36 CRONOGRAMA EM ATRASO - 16 DIAS	


Aprovado 28/11/2024 17:37
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/11/2024 17:38
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/11/2024 18:55
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro
