


<div></div> <div></div>				Relatório nº	64
				Data do relatório	01/11/2024
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	82 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	7 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Atividades (1)	
Vistoria da execução da cobertura	Concluída

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.	

Fotos (8)	
 <p>Avenida Visconde de Guarapuava, 4186 Batel Curitiba PR 80250-220 S 25° 26' 29", W 49° 16' 53" 01/11/2024, 08:58</p>	 <p>Avenida Visconde de Guarapuava, 4186 Batel Curitiba PR 80250-220 S 25° 26' 29", W 49° 16' 52" 01/11/2024, 08:53</p>

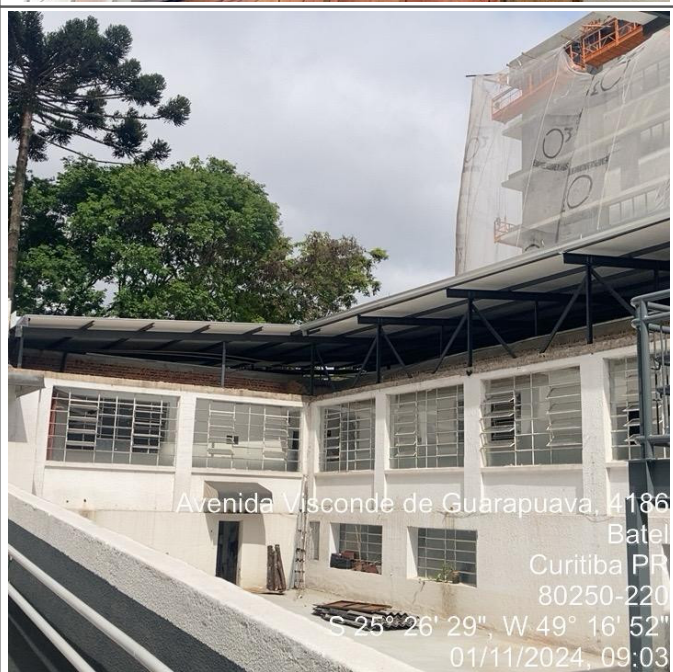



Aprovado 05/01/2025 19:29

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL

Aprovado 28/01/2025 09:19

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL

Aprovado 28/01/2025 09:27

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório n°	65
				Data do relatório	04/11/2024
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	85 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	4 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Atividades (1)	
Levantamento dos quantitativos de materiais para fechamento e forro das áreas de reforma.	Concluída
O IPC irá arcar com o forro PVC da área do refeitório e cozinha.	

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.	



Aprovado 05/01/2025 19:51

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:19

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:28

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	66
				Data do relatório	06/11/2024
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	87 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	2 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (3)						
Gesseiro						Mão de Obra Direta (3)
3						

Atividades (1)	
Mobilização para início dos trabalhos de fechamento e forro	Iniciada

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.	



Aprovado 05/01/2025 20:11

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:19

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:29

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	67
				Data do relatório	07/11/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	88 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	1 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (5)						
Gesseiro						Mão de Obra Direta (5)
5						

Atividades (1)	
Fechamento da estrutura da cobertura com Placa Cimentícia	Em Andamento
Execução do forro dos dormitórios em Drywall	
Execução do forro do refeitório e cozinha em PVC	

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.	



Aprovado 05/01/2025 20:16

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:19

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:29

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro


<div></div> <div></div>				Relatório nº	68
				Data do relatório	08/11/2024
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	0 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (5)						Mão de Obra Direta (5)
Gesseiro						
5						

Atividades (1)	
Fechamento da estrutura da cobertura com Placa Cimentícia	Em Andamento
Execução do forro dos dormitórios em Drywall	
Execução do forro do refeitório e cozinha em PVC	

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.	

Fotos (1)	
	



Aprovado 05/01/2025 20:22

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:19

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:30

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	69
				Data do relatório	13/11/2024
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	-5 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (5)						
Gesseiro						Mão de Obra Direta (5)
5						

Atividades (1)	
Fechamento da estrutura da cobertura com Placa Cimentícia	Em Andamento
Execução do forro dos dormitórios em Drywall	
Execução do forro do refeitório e cozinha em PVC	

Comentários (1)
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.




Aprovado 05/01/2025 20:26

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:20

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:30

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro



<div></div> <div></div>				Relatório nº	70
				Data do relatório	14/11/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	-6 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (5)						
Gesseiro						Mão de Obra Direta (5)
5						

Atividades (1)	
Fechamento da estrutura da cobertura com Placa Cimentícia	Em Andamento
Execução do forro dos dormitórios em Drywall	
Execução do forro do refeitório e cozinha em PVC	

Comentários (1)
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.

Fotos (5)	
 <p>Avenida Visconde de Guarapuava, 4186 Batel Curitiba PR 80250-220 S: 25° 26' 30", W 49° 16' 53" 14/11/2024, 17:20</p>	 <p>Avenida Visconde de Guarapuava, 4186 Batel Curitiba PR 80250-220 S 25° 26' 29", W 49° 16' 52" 14/11/2024, 16:36</p>

 <p>Avenida Visconde de Guarapuava, 4186 Batel Curitiba PR 80250-220 S 25° 26' 29", W 49° 16' 52" 14/11/2024, 16:36</p>	 <p>Avenida Visconde de Guarapuava, 4177 Batel Curitiba PR 80420-370 S 25° 26' 31", W 49° 16' 53" 14/11/2024, 16:37</p>
 <p>Avenida Visconde de Guarapuava, 4186 Batel Curitiba PR 80250-220 S 25° 26' 29", W 49° 16' 52" 14/11/2024, 16:40</p>	



Aprovado 05/01/2025 20:31

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:20

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:31

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro


<div></div> <div></div>				Relatório nº	71
				Data do relatório	15/11/2024
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	-7 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável


Mão de obra (5)						Mão de Obra Direta (5)
Gesseiro						
5						

Atividades (1)	
Fechamento da estrutura da cobertura com Placa Cimentícia	Em Andamento
Execução do forro dos dormitórios em Drywall	
Execução do forro do refeitório e cozinha em PVC	

Comentários (1)
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.

Fotos (1)	
	


Aprovado 05/01/2025 20:32
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/01/2025 09:20
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/01/2025 09:31
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro



<div></div> <div></div>				Relatório nº	72
				Data do relatório	18/11/2024
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	-10 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (5)						
Gesseiro						Mão de Obra Direta (5)
5						

Atividades (1)	
Fechamento da estrutura da cobertura com Placa Cimentícia	Em Andamento
Execução do forro dos dormitórios em Drywall	
Execução do forro do refeitório e cozinha em PVC	

Comentários (1)
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.

Fotos (7)	
 <p>Avenida Visconde de Guarapuava, 4186 Batel Curitiba PR 80250-220 S 25° 26' 29", W 49° 16' 53" 18/11/2024, 10:07</p>	 <p>Avenida Visconde de Guarapuava, 4186 Batel Curitiba PR 80250-220 S 25° 26' 30", W 49° 16' 52" 18/11/2024, 09:56</p>





Aprovado 05/01/2025 20:39

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL

Aprovado 28/01/2025 09:20

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL

Aprovado 28/01/2025 09:31

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro


<div></div> <div></div>				Relatório nº	73
				Data do relatório	19/11/2024
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	-11 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável


Mão de obra (5)						Mão de Obra Direta (5)
Gesseiro						
5						

Atividades (1)	
Fechamento da estrutura da cobertura com Placa Cimentícia	Em Andamento
Execução do forro dos dormitórios em Drywall	
Execução do forro do refeitório e cozinha em PVC	

Comentários (1)
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.

Fotos (1)
 <p>Avenida Visconde de Guarapuava, 4186 Batel Curitiba PR 80250-220 S 25° 26' 29", W 49° 16' 53" 19/11/2024, 15:33</p>


Aprovado 05/01/2025 20:41
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/01/2025 09:20
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/01/2025 09:32
Juliana da Silva Colloço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	74
				Data do relatório	20/11/2024
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	-12 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (5)						
Gesseiro						Mão de Obra Direta (5)
5						

Atividades (1)	
Fechamento da estrutura da cobertura com Placa Cimentícia	Em Andamento
Execução do forro dos dormitórios em Drywall	
Execução do forro do refeitório e cozinha em PVC	

Comentários (1)
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.



Aprovado 05/01/2025 20:43

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:20

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:32

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	75
				Data do relatório	21/11/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	-13 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (5)						
Gesseiro						Mão de Obra Direta (5)
5						

Atividades (1)	
Fechamento da estrutura da cobertura com Placa Cimentícia	Em Andamento
Execução do forro dos dormitórios em Drywall	
Execução do forro do refeitório e cozinha em PVC	

Comentários (1)
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.



Aprovado 05/01/2025 20:43

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:21

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:32

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	76
				Data do relatório	22/11/2024
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	-14 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (5)						
Gesseiro						Mão de Obra Direta (5)
5						

Atividades (1)	
Fechamento da estrutura da cobertura com Placa Cimentícia	Em Andamento
Execução do forro dos dormitórios em Drywall	
Execução do forro do refeitório e cozinha em PVC	


Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.	

Fotos (5)	
 <p>Avenida Visconde de Guarapuava, 4150 Batel Curitiba PR 80250-220 S 25° 26' 29", W 49° 16' 52" 22/11/2024, 10:29</p>	 <p>Rua Coronel Dulcídio, 956 Batel Curitiba PR 80420-170 S 25° 26' 30", W 49° 16' 54" 22/11/2024, 10:11</p>

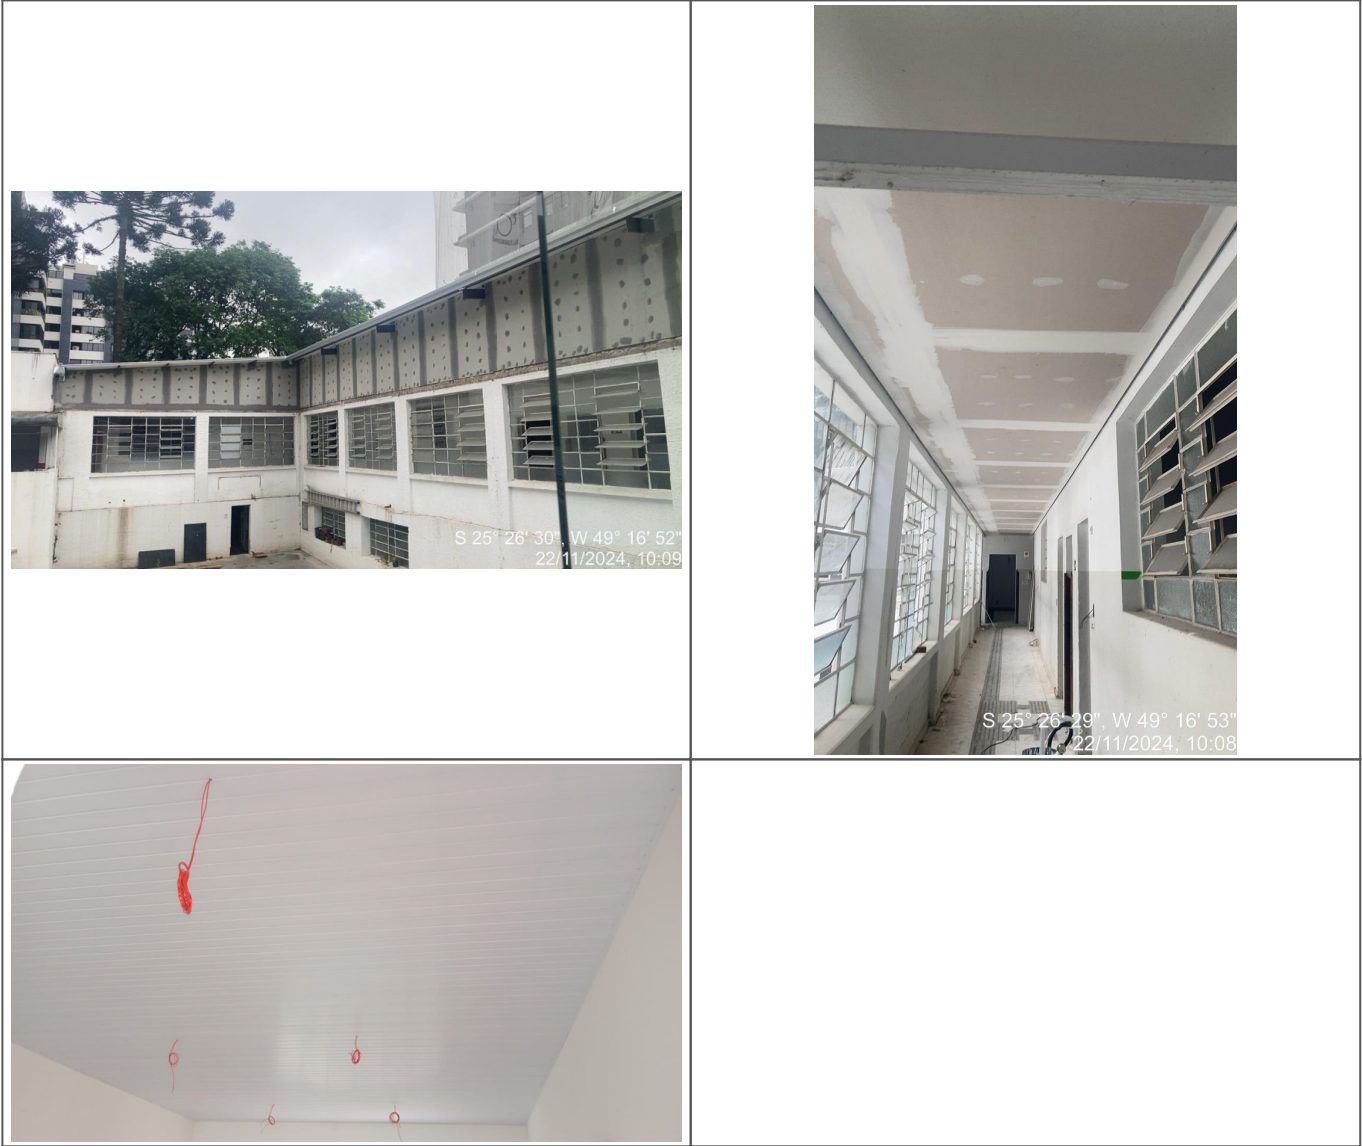


Aprovado 05/01/2025 20:45

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:22

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:32

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	77
				Data do relatório	25/11/2024
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	-17 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (5)						
Gesseiro						Mão de Obra Direta (5)
5						

Atividades (1)	
Fechamento da estrutura da cobertura com Placa Cimentícia	Em Andamento
Execução do forro dos dormitórios em Drywall	
Execução do forro do refeitório e cozinha em PVC	

Comentários (1)
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.



Aprovado 05/01/2025 20:50

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:23

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:33

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro



<div></div> <div></div>				Relatório nº	78
				Data do relatório	26/11/2024
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	-18 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável


Mão de obra (4)						Mão de Obra Direta (4)
Gesseiro						
4						


Atividades (1)	
Fechamento da estrutura da cobertura com Placa Cimentícia	Em Andamento
Execução do forro dos dormitórios em Drywall	
Execução do forro do refeitório e cozinha em PVC	

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.	

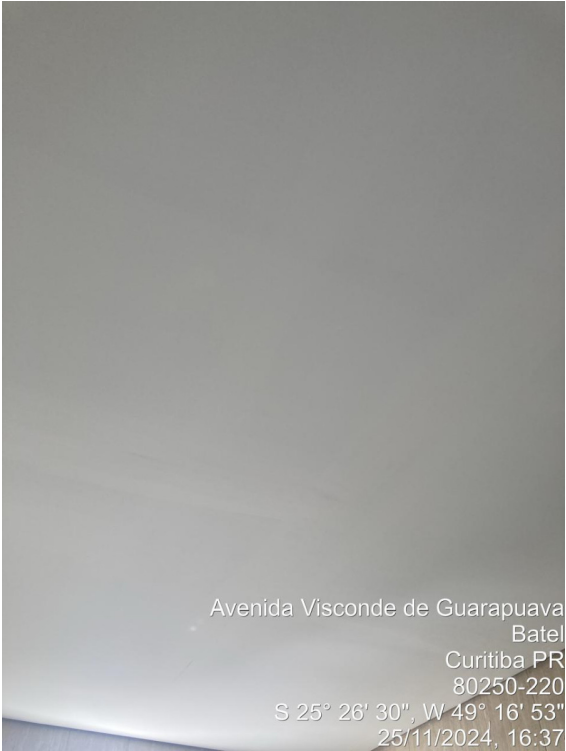Fotos (6)	
 <p>Avenida Visconde de Guarapuava Batel Curitiba PR 80250-220 S 25° 26' 30", W 49° 16' 53" 25/11/2024, 16:37</p>	 <p>Rua Coronel Dulcídio, 921 Batel Curitiba PR 80420-170 S 25° 26' 29", W 49° 16' 53" 25/11/2024, 16:38</p>

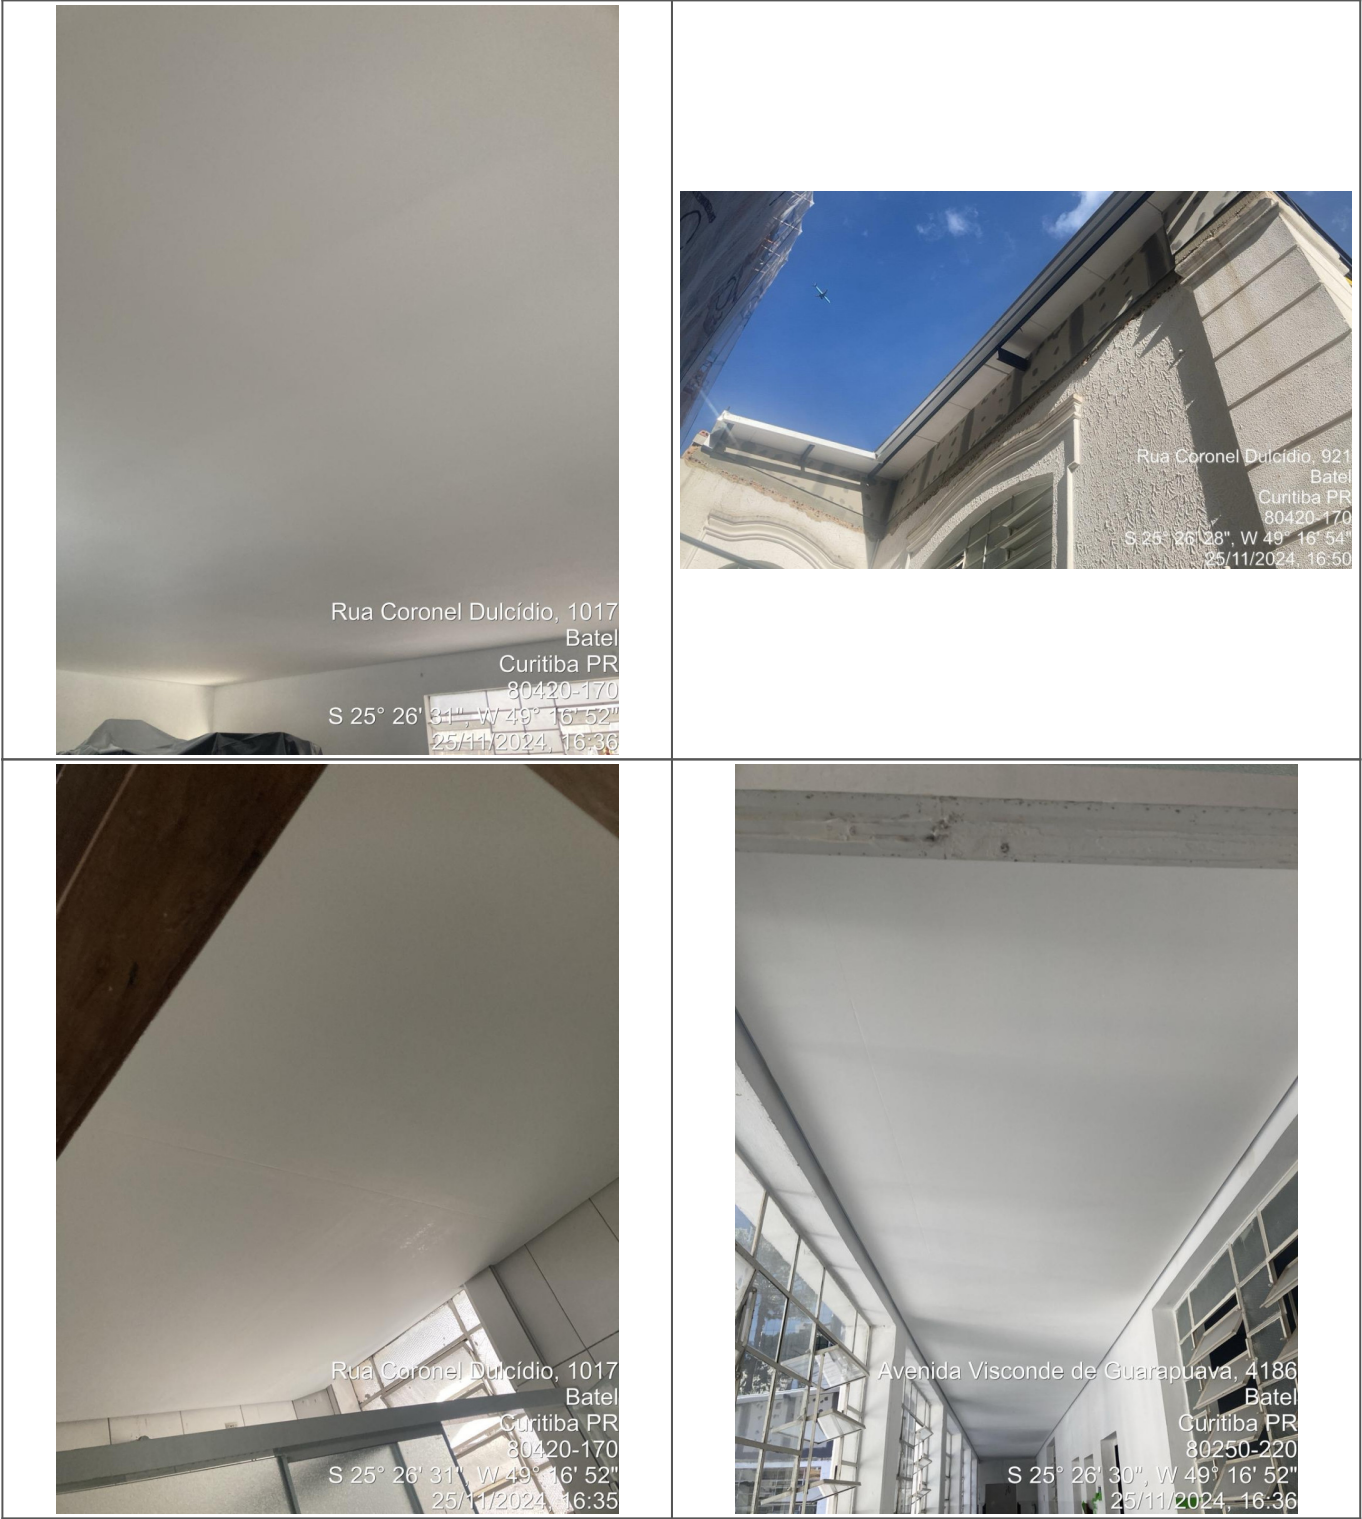


Aprovado 05/01/2025 20:51
ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/01/2025 09:23
EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL


Aprovado 28/01/2025 09:33
Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	79
				Data do relatório	27/11/2024
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	-19 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (2)						
Gesseiro						Mão de Obra Direta (2)
2						

Atividades (1)	
Fechamento da estrutura da cobertura com Placa Cimentícia	Em Andamento
Execução do forro dos dormitórios em Drywall	
Execução do forro do refeitório e cozinha em PVC	

Comentários (1)
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.



Aprovado 05/01/2025 20:54

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:23

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:33

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	80
				Data do relatório	28/11/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	-20 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (2)						
Gesseiro						Mão de Obra Direta (2)
2						

Atividades (1)	
Fechamento da estrutura da cobertura com Placa Cimentícia	Em Andamento
Execução do forro dos dormitórios em Drywall	
Execução do forro do refeitório e cozinha em PVC	

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.	



Aprovado 05/01/2025 21:26

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:23

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:35

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	81
				Data do relatório	29/11/2024
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	-21 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (6)						Mão de Obra Direta (6)
Gesseiro						
6						

Atividades (1)	
Fechamento da estrutura da cobertura com Placa Cimentícia	Em Andamento
Execução do forro dos dormitórios em Drywall	
Execução do forro do refeitório e cozinha em PVC	

Comentários (1)
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.



Aprovado 05/01/2025 21:17

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:23

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:35

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro
