

<div></div> <div></div>				Relatório nº	82
				Data do relatório	02/12/2024
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	-24 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (6)						Mão de Obra Direta (6)
Gesseiro						
6						

Atividades (1)	
Fechamento da estrutura da cobertura com Placa Cimentícia	Em Andamento
Execução do forro dos dormitórios em Drywall	
Execução do forro do refeitório e cozinha em PVC	

Comentários (1)
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.



Aprovado 05/01/2025 21:18

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:23

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:35

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro



<div></div> <div></div>				Relatório nº	83
				Data do relatório	03/12/2024
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	-25 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (6)						
Gesseiro						Mão de Obra Direta (6)
6						

Atividades (1)	
Fechamento da estrutura da cobertura com Placa Cimentícia	Em Andamento
Execução do forro dos dormitórios em Drywall	
Execução do forro do refeitório e cozinha em PVC	

Comentários (1)
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.

Fotos (5)	
 <p>Rua Coronel Dulcídio, 1017 Batel Curitiba PR 80420-170 S 25° 26' 31", W 49° 16' 53" 02/12/2024, 16:42</p>	 <p>Avenida Visconde de Guarapuava, 4186 Batel Curitiba PR 80250-220 S 25° 26' 29", W 49° 16' 52" 02/12/2024, 16:42</p>

 <p>Avenida Visconde de Guarapuava, 4186 Batel Curitiba PR 80250-220 S 25° 26' 30", W 49° 16' 53" 02/12/2024, 16:42</p>	 <p>Avenida Visconde de Guarapuava, 4186 Batel Curitiba PR 80250-220 S 25° 26' 29", W 49° 16' 52" 02/12/2024, 17:15</p>
 <p>Rua Coronel Dulcídio, 1017 Batel Curitiba PR 80420-170 S 25° 26' 31", W 49° 16' 53" 02/12/2024, 16:42</p>	




Aprovado 05/01/2025 21:23

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:23

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:39

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	84
				Data do relatório	04/12/2024
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	-26 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (5)						
Gesseiro						Mão de Obra Direta (5)
5						

Atividades (1)	
Fechamento da estrutura da cobertura com Placa Cimentícia	Em Andamento
Execução do forro dos dormitórios em Drywall	
Execução do forro do refeitório e cozinha em PVC	

Comentários (1)
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.




Aprovado 05/01/2025 21:24

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:24

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:40

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	85
				Data do relatório	05/12/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	-27 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (2)						
Gesseiro						Mão de Obra Direta (2)
2						

Atividades (1)	
Fechamento da estrutura da cobertura com Placa Cimentícia	Em Andamento
Execução do forro dos dormitórios em Drywall	
Execução do forro do refeitório e cozinha em PVC	

Comentários (1)
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.




Aprovado 05/01/2025 21:24

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:24

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:40

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro

<div></div> <div></div>				Relatório nº	86
				Data do relatório	06/12/2024
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	-28 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (2)						
Gesseiro						Mão de Obra Direta (2)
2						

Atividades (1)	
Fechamento da estrutura da cobertura com Placa Cimentícia	Em Andamento
Execução do forro dos dormitórios em Drywall	
Execução do forro do refeitório e cozinha em PVC	

Comentários (1)	
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.	




Aprovado 05/01/2025 21:25

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:18

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL



Aprovado 28/01/2025 09:40





Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro


<div></div> <div></div>				Relatório n°	87
				Data do relatório	09/12/2024
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	752.E.2024
Obra	EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO IPC TERMO DE FOMENTO Nº 6816 - FAS			Prazo contratual	89 dias
Local	VISCONDE DE GUARAPUAVA, Nº 4186 - CURITIBA - PARANÁ			Prazo decorrido	89 dias
Contratante	INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC	Responsável	EDUARDO AMANCIO	Prazo a vencer	-31 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável


Atividades (1)	
Serviços do contrato, finalizados.	Concluída
Inspeção geral do Contratante.	
Fotos no relatório são pós finalização dos serviços da O3 Empreendimentos, que não constam no Contrato.	

Comentários (1)
ANDERSON CURCZ 05/01/2025 19:27 CRONOGRAMA EM ATRASO - 24 DIAS 18 DIAS EM FUNÇÃO DO ATRASO NAS ADEQUAÇÕES DA O3 ENGENHARIA 6 DIAS EM FUNÇÃO DOS DIAS CHUVOSOS IMPRATICÁVEIS.

Fotos (22)	
	 <p>Avenida Visconde de Guarapuava, 4177 Batel Curitiba PR 80250-220 S 25° 26' 30", W 49° 16' 52" 14/01/2025, 16:09</p>
 <p>Avenida Visconde de Guarapuava, 4186 Batel Curitiba PR 80250-220 S 25° 26' 30", W 49° 16' 52" 14/01/2025, 14:09</p>	 <p>Avenida Visconde de Guarapuava, 4186 Batel Curitiba PR 80250-220 S 25° 26' 30", W 49° 16' 53" 14/01/2025, 14:10</p>

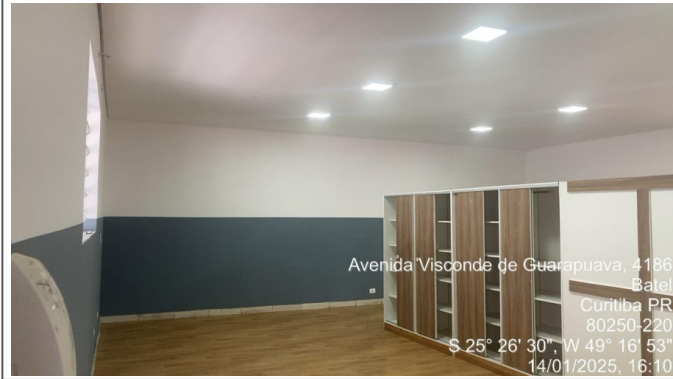



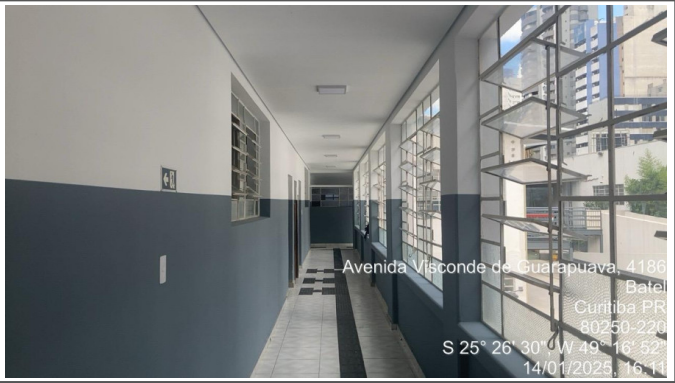

Aprovado 28/01/2025 10:00

ANDERSON CURCZ
anderson.curcz@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL

Aprovado 28/01/2025 10:01

EDUARDO AMANCIO
eduardo.amancio@azcengenharia.com.br
ENGENHEIRO CIVIL

Aprovado 28/01/2025 10:15

Juliana da Silva Collaço
contabilidade@novoipc.org.br
Financeiro
